

■令和元年度レインボーブリッジ北側水域沈木対策維持しゅんせつ工事のお知らせ

1. 工 事 件 名

令和元年度レインボーブリッジ北側水域沈木対策維持しゅんせつ工事
2. 工 事 場 所

東京都中央区晴海五丁目地先 及び 東京都江東区青海三丁目地先
3. 工 事 期 間

令和元年11月13日～令和2年 3月23日（予定）
4. 工 事 内 容

本工事は港湾管理者からの依頼により、レインボーブリッジ北側水域の維持水深を確保するものである。
5. 安 全 対 策

・警戒船は、しゅんせつ箇所・分離箇所に各1隻/日配置します。

・夜間は作業船四隅に点滅灯を配置します。

・晴海ふ頭を使用する一般船舶が入港する際は邪魔にならない場所まで退避します。

・作業時間は原則として日出から日没とします。
6. 工 事 数 量

しゅんせつ工 しゅんせつ深度 A.P.-7.5m

しゅんせつ面積 31,627m²

しゅんせつ土量 15,372m³
7. 発 注 者

東京都港湾局 【監督部署；東京港建設事務所 浚渫工事課】

TEL 03-3471-0883 FAX 03-3471-0727
8. 受 注 者

青木・ダムドレ建設共同企業体


東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号

Tel :03-3665-9621 Fax : 03-3665-9622

現場代理人兼監理技術者 崎田 祐治：Tel 090-8871-6970

主任技術者 鈴木 卓次：Tel 090-8952-1425

9 施 工 位 置 図

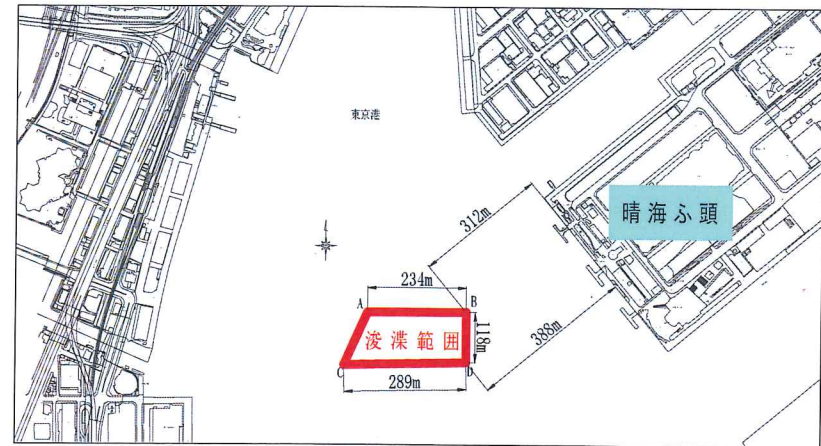

レインボウブリッジ浚渫区域




木皮土砂分離場

10. 工 程 表 （ 予 定 ）


工 種 ・ 内 訳	形状・寸法	単位	数量	令和元年												令和2年												摘 要
				11月				12月				1月				2月				3月								
				1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	28	1	10	20	31					
準備工	申請・届出／事前測量	式	1	11/13 関係諸官庁申請												事後測量(RB北)				事後測量(分離場)								
グラブ浚渫工	レインボーブリッジ北側水域	m3	15,372																					凡例 -----：予備日				
木皮土砂分離工	分離場	m3	15,285																									
グラブ浚渫工	分離場	m3	15,285																									
土運船運搬工	レインボー北側～分離場	m3	15,372																									
	分離場～土捨場	m3	15,285																									
沈木撤去・仮置	レインボー北側(撤去)～中央防波堤(運搬・仮置)	本	76																	掃陸工								
係留杭打設・引抜	係留杭(H-400×400 L=20.0m)	本	10					打設												引抜								
警戒船配備	RB北側水域・分離場(N型警戒船×各1隻)	式	1																									

11. 施 工 状 況 図


レインボウブリッジ浚渫区域

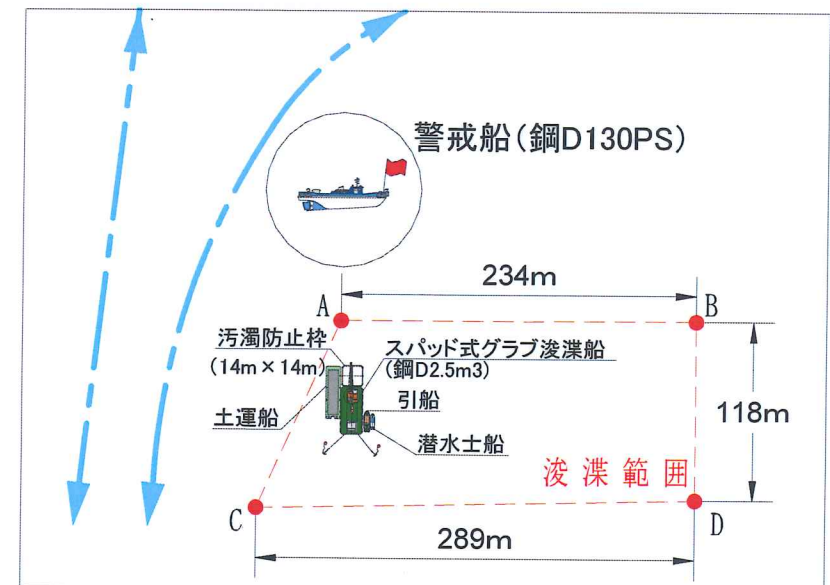

木皮土砂分離場

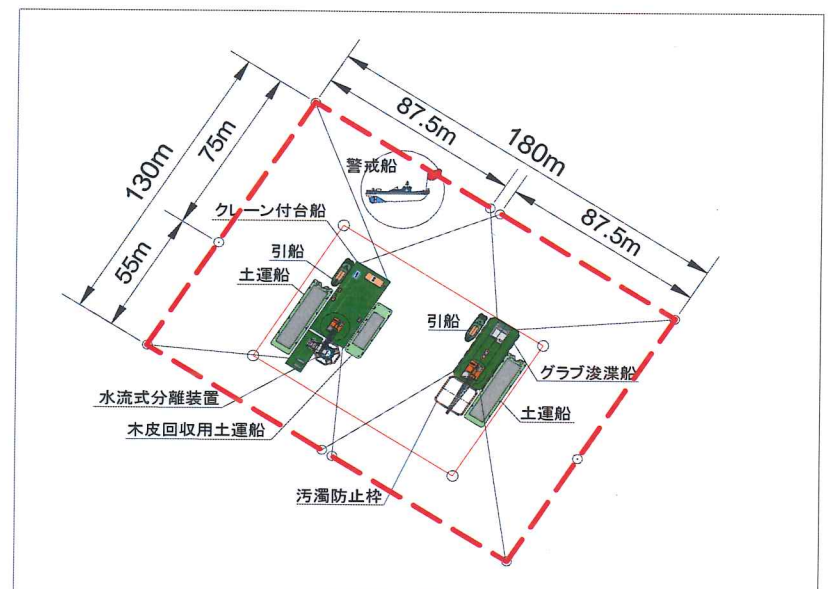

12. 作業船運航経路および夜間停泊場所

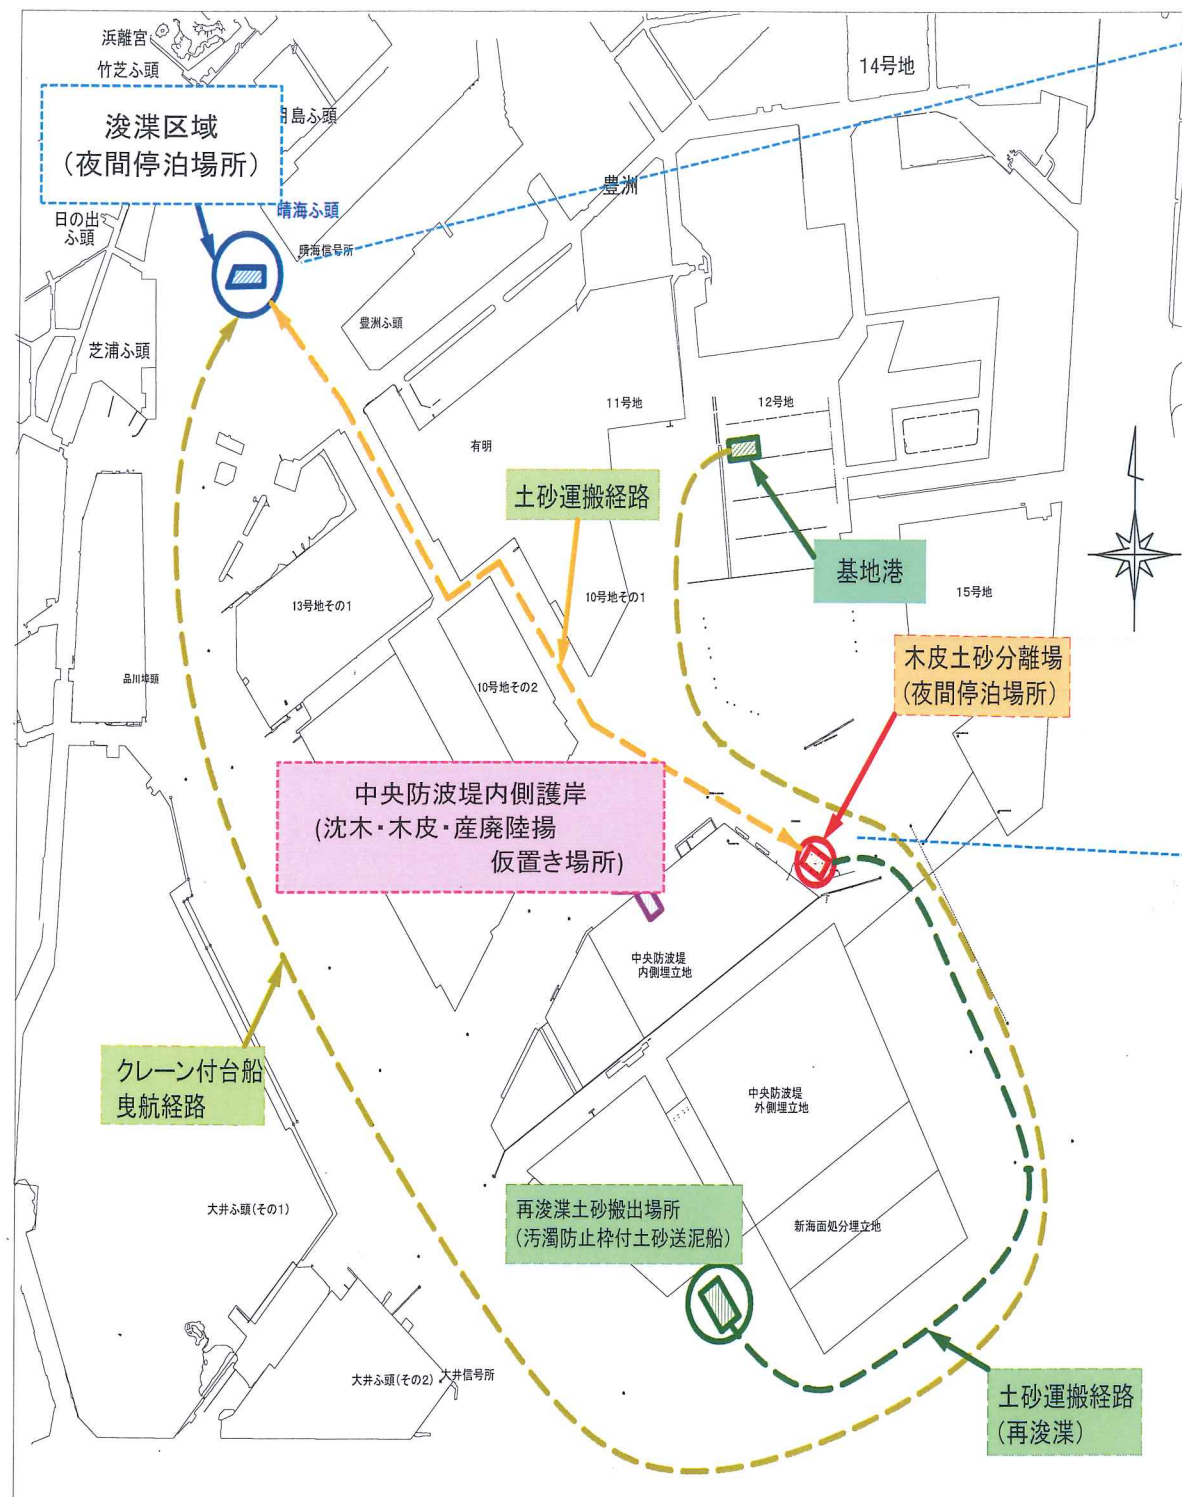

13. 夜間停泊状況図

