工　事　概　要　書

1．　工事件名　：　七枝橋（内回り及び外回り）長寿命化工事（その1）
2．　工事場所　：　東京都江東区潮見一丁目地内から同区辰巳二丁目地内まで
3．　工事期間　：　令和3年3月15日　～　令和4年2月24日
4．　発注者　：　東京都第五建設事務所　江東工区
5．　施工者　：　株式会社　大達土木
現場代理人兼監理技術者：能戸　一行　携帯090-9682-0041
現場事務所　TEL03-5243-0201　FAX03-5243-0156
6．　工事概要　：　七枝橋（外回り）橋長　108.8m
（1）橋梁補修工　一式
（2）仮設工　一式
七枝橋（内回り）橋長　108.8m
（1）橋梁補修工　一式
（2）防食被覆工　一式
（3）掘削工　一式
（4）仮設工　一式

7．　工事工程表（予定）

工　種		数 量	令和3年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和4年 1月	2月	備 考
準備工		1式	諸手続、施工計画、他工事調整												
外回り	補修工	1式													
外回り	足場工	1式				設置						撤去			
内回り	補修工	1式													
内回り	被覆防食工	1式													海上作業
内回り	掘削工	1式							掘削			埋戻し			海上作業
内回り	足場工	1式													
調査工		1式				深浅測量他									海上作業
片付け		1式													

◆工事による影響について

工事に伴う足場の設置により、橋桁より約８０㎝低くなるため、航行時に注意が必要になります。
・七枝橋（Ｈ．Ｗ．Ｌ．－2.8m～4.0m）
ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど、よろしくお願いします。

期間：足場設置予定　令和3年6月7日～令和3年12月24日（予定）

施　工　位　置　図

平　面　図（足場工）（予定）

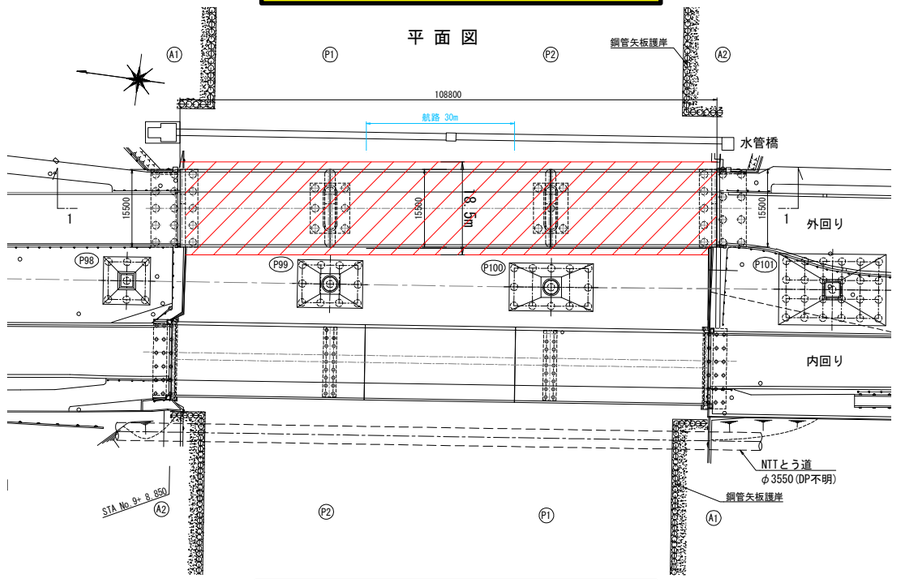

標準断面図（足場工）（予定）

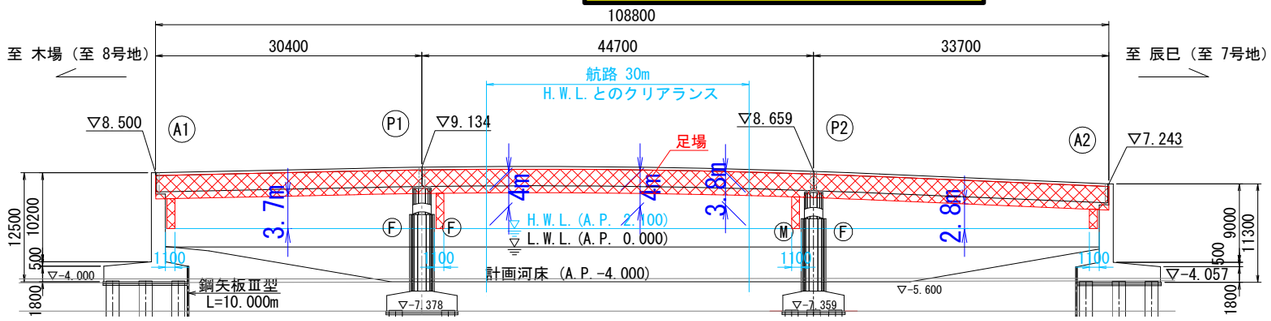

工　事　概　要　書（2）

ポンプ浚渫状況図（予定）

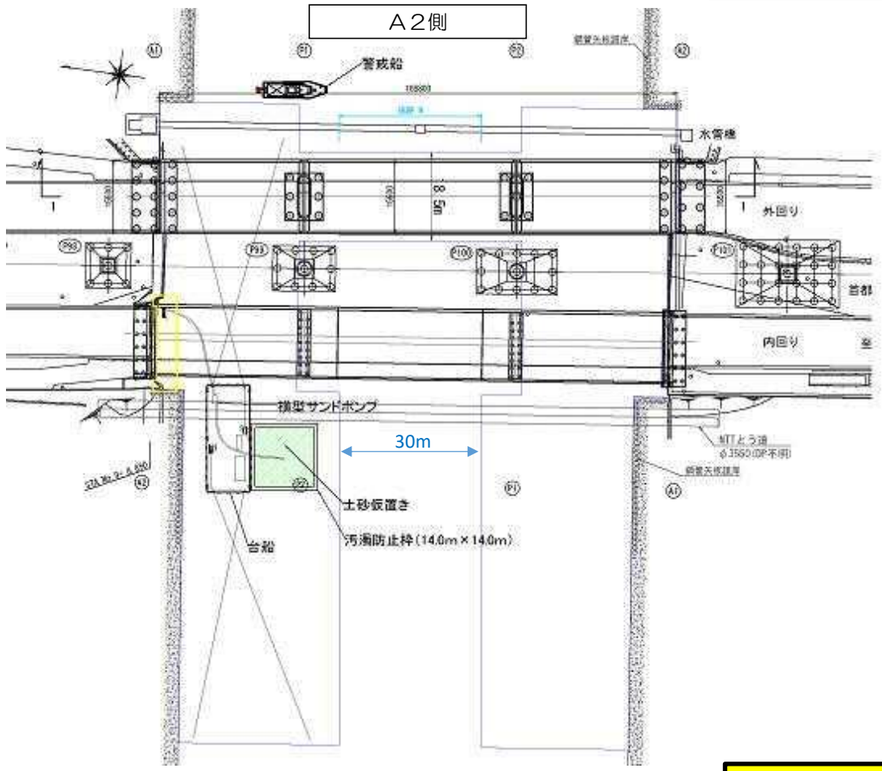

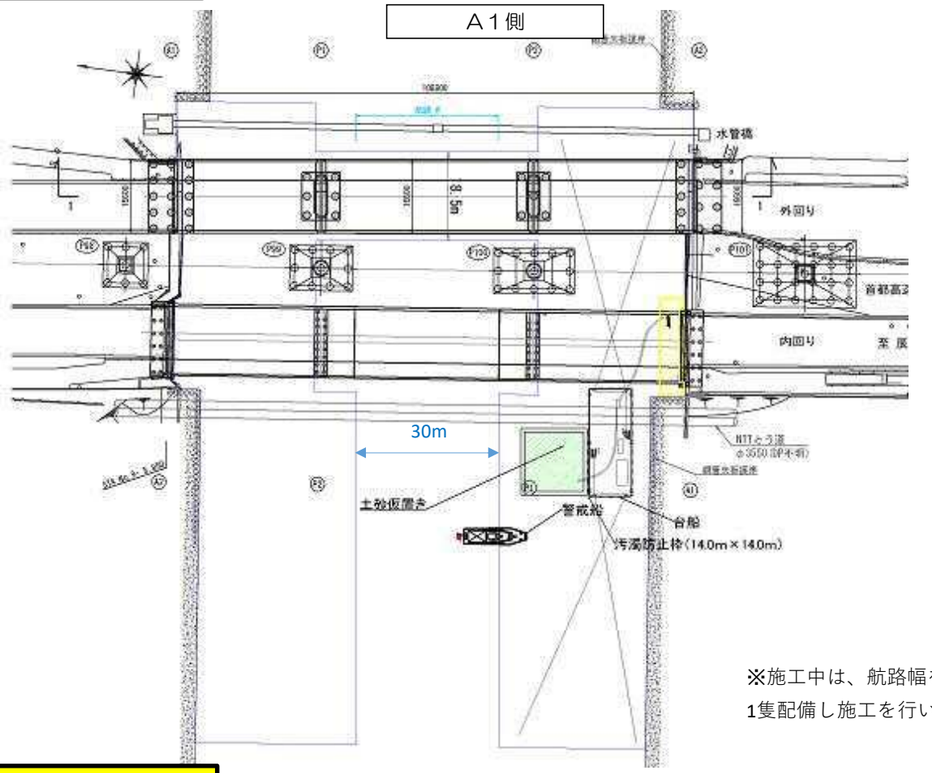

※施工中は、航路幅を30m確保し警戒船を1隻配備し施工を行います。

休止日及び夜間停泊状況図（予定）

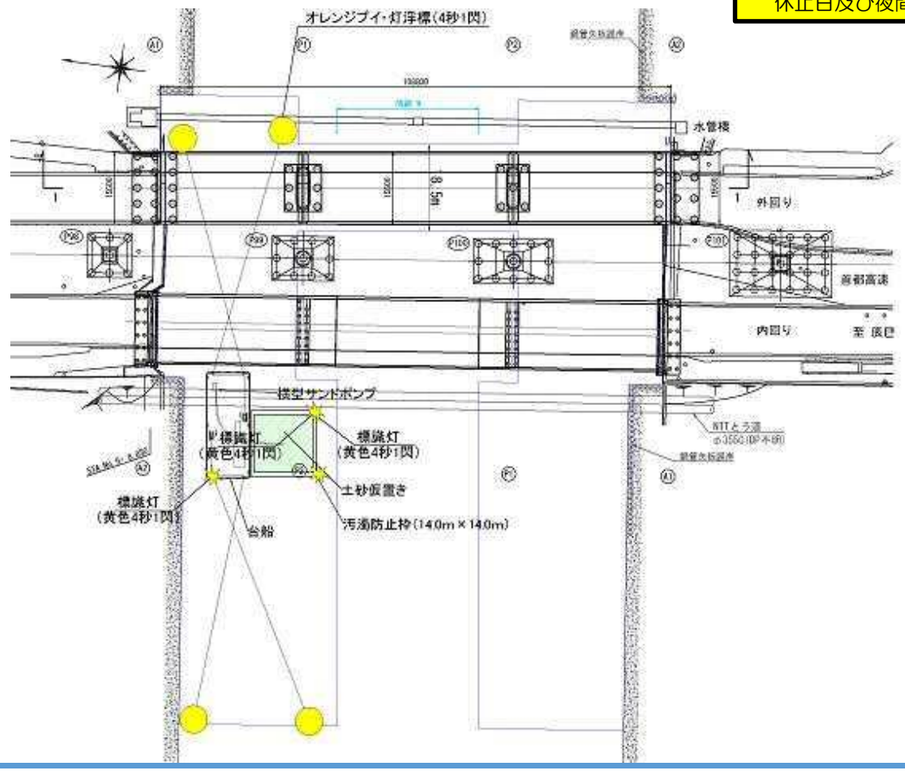

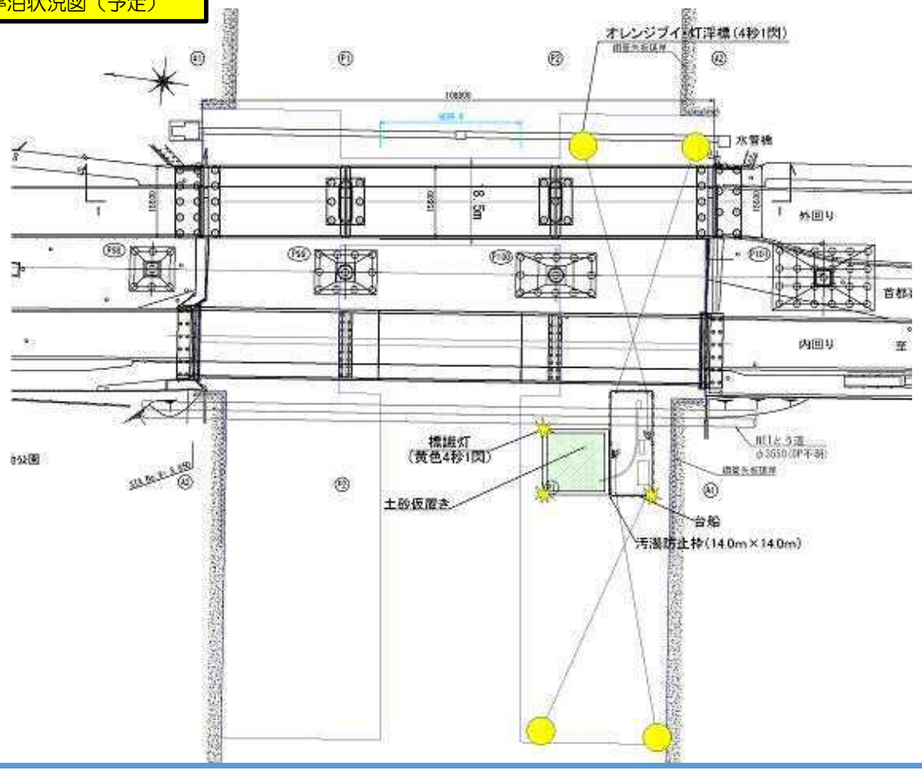

工　事　概　要　書（3）

バックホウ浚渫状況図（予定）

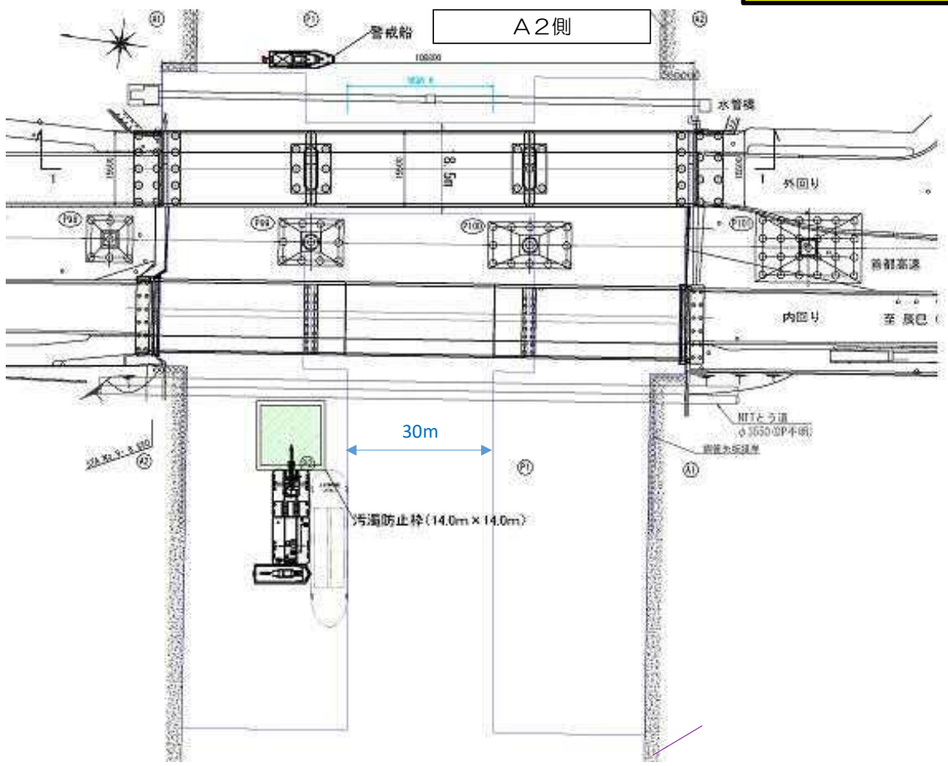

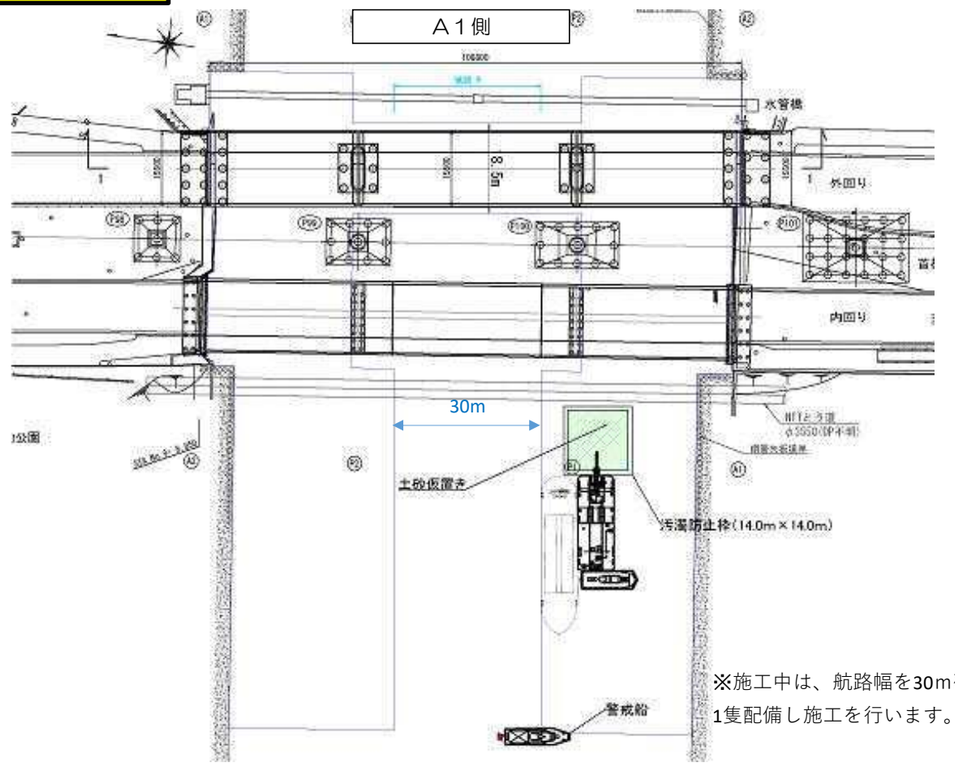

※施工中は、航路幅を30m確保し警戒船を1隻配備し施工を行います。

休止日及び夜間停泊状況図（予定）

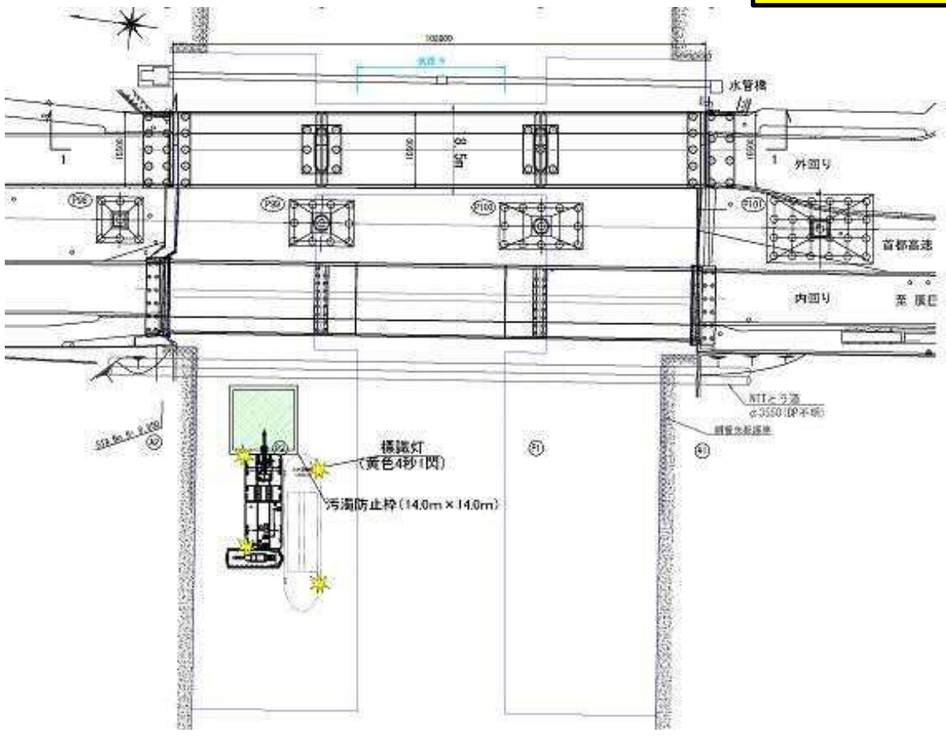

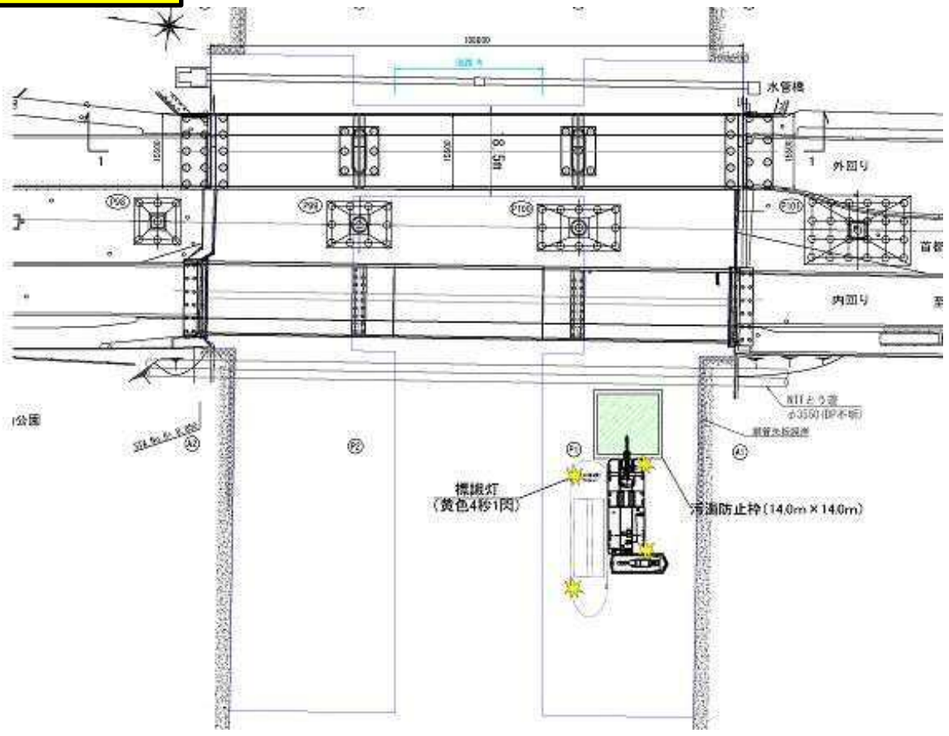

工　事　概　要　書（4）

埋戻し状況図（予定）

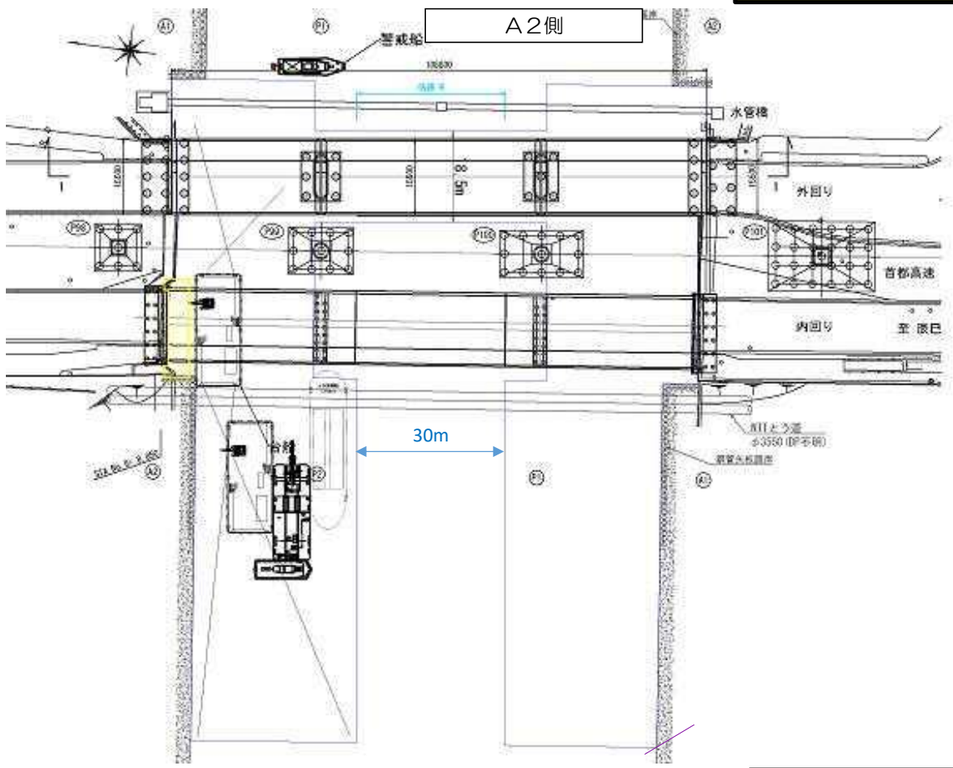

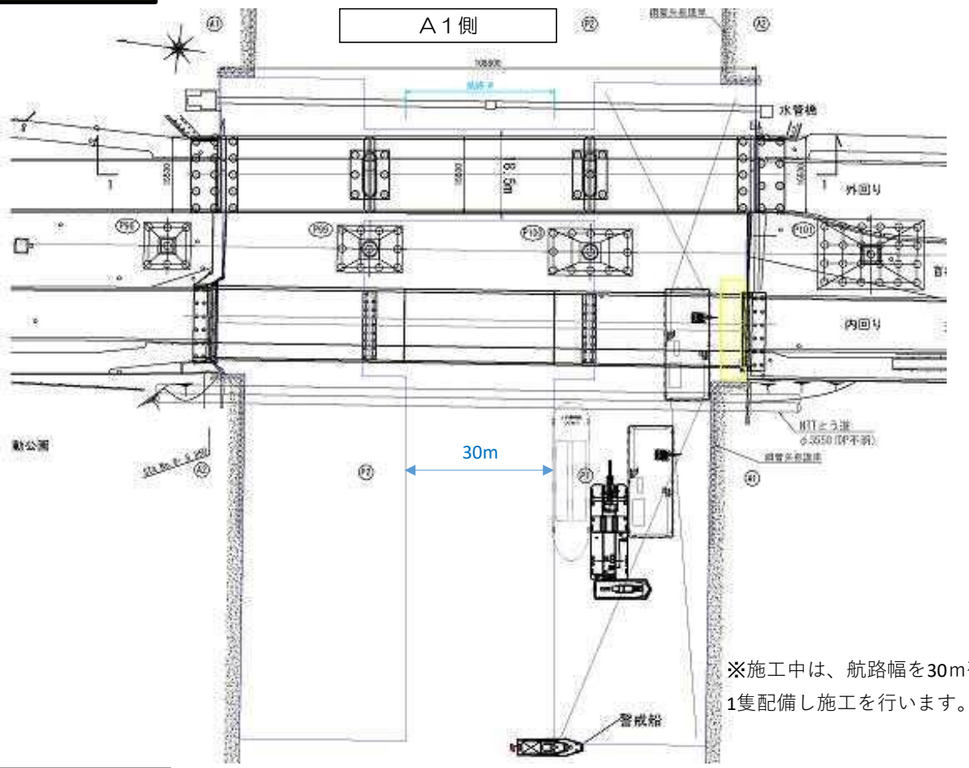

※施工中は、航路幅を30m確保し警戒船を1隻配備し施工を行います。
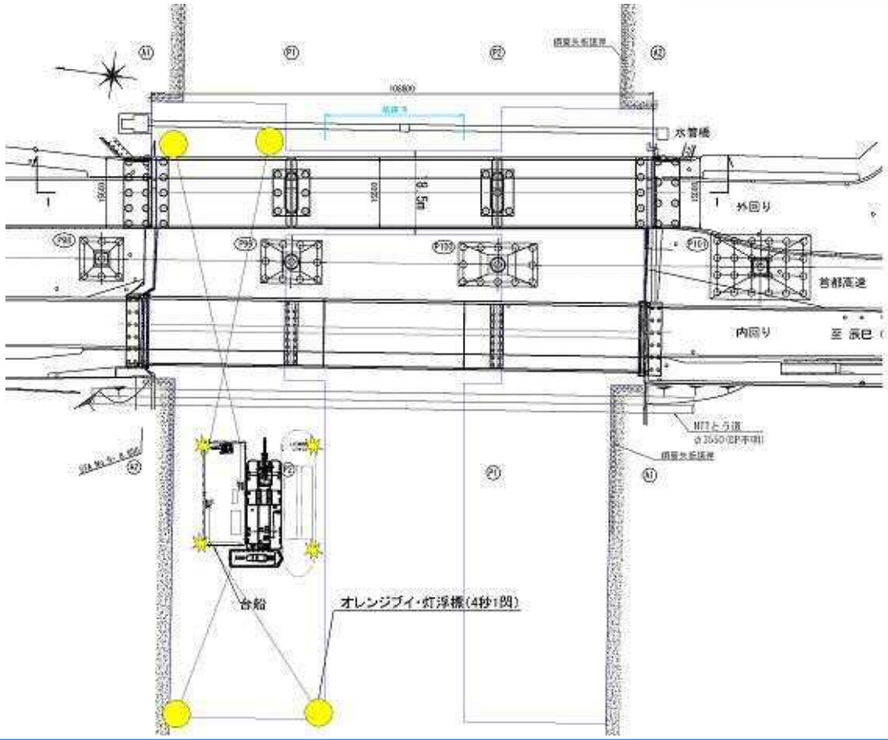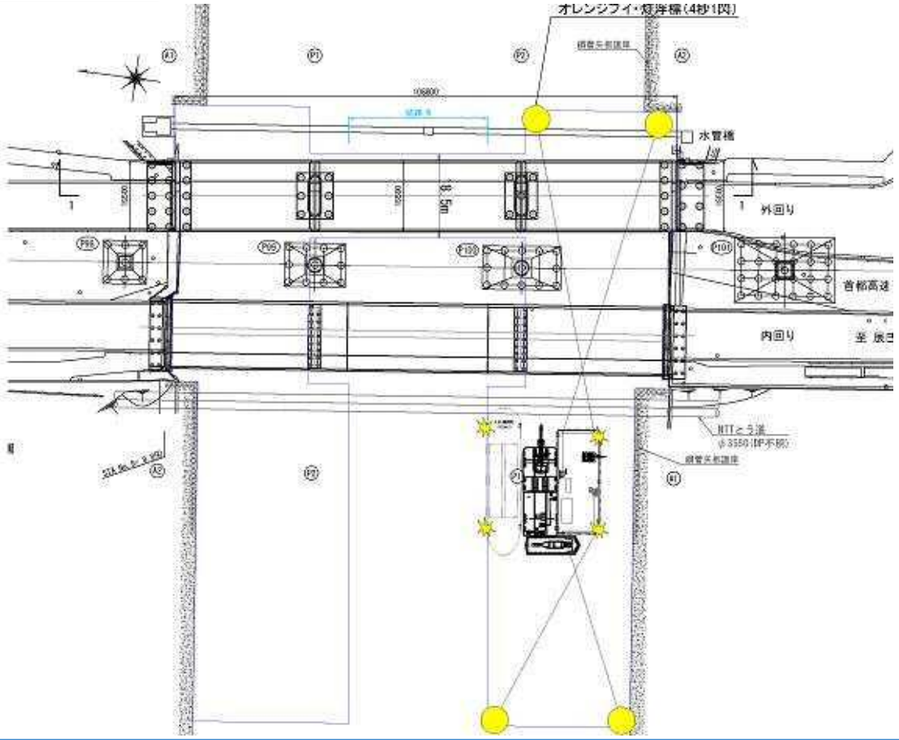
休止日及び夜間停泊状況図（予定）
